

Protokół
z dnia 18.04.2013 r.
inwentaryzacji wykonanych robót

spisany w dniu 18 kwietnia 2013 r. podczas posiedzenia Komisji inwentaryzacyjnej wykonanych robót na okoliczność przerwania robót przez Generalnego Wykonawcę zadania pn. **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Niegowa przy Szkole Podstawowej w Ludwinowie nr 30**

Komisja w składzie:

Przedstawiciel Zamawiającego:

1. Mirosław Szczepańczyk – Przewodniczący Komisji
2. Augustyn Ulman – Inspektor Nadzoru
3. Paweł Piśkuła – Inspektor UG Niegowa


Stwierdza, co następuje:

- I. Roboty zostały przerwane około 20 grudnia 2012 r.
- II. Zgodnie z zakresem robót zostały wykonane następujące roboty:
 1. Roboty rozbiórkowe
 2. Roboty ziemne i podbudowy
 3. Drenaż boiska
 4. Zagospodarowanie terenu - chodniki i ciągi piesze – wykonane w części
 5. Budynek sanitarno szatniowy w stanie surowym zamkniętym
 6. Oświetlenie boisk – 10 szt. masztów i 5 szt. lamp – częściowe
 7. Przyłącza
 8. Instalacja wodno – kanalizacyjna zewnętrzna
- III. Inwentaryzacji poddano również n/w materiały:
 1. Kostka brukowa szara gr. 8 cm
Ilość sztuk w 1 palecie $4 \times 5 \times 8 + 6 \times 3 \times 8 = 304$ szt.
Ilość palet $49,5 \times 8,06 \text{ m}^2 = 398,97 \text{ m}^2$
 2. Kostka brukowa czerwona gr. 6 cm
Ilość sztuk w 1 palecie $9 \times 6 \times 11 = 594$ szt.
Ilość palet $24 \times 11,88 \text{ m}^2 = 285,12 \text{ m}^2$
 3. Płyta chodnikowa pełna – betonowa o wymiarach $50 \times 50 \times 6$ cm – szt. 70
 4. Krawężnik drogowy betonowy $15 \times 30 \times 100$ cm – szt. 112
 5. Obrzeża trawnikowe o wymiarach $8 \times 30 \times 100$ – szt. 39
 6. Płyta betonowa ażurowa 40×60 cm – $80,03 \text{ m}^2$

Materiały budowlane

1. Pustaki ceramiczne POROTHERM $30 \times 24 \times 24$ cm – szt. 60
2. Pustaki ceramiczne POROTHERM $50 \times 24 \times 8$ cm – szt. 34
3. Cegła pełna $25 \times 12 \times 6$ cm – szt. 50
4. Płyta OSB gr. 18 mm o wymiarach $2,50 \times 1,25$ m – szt. 14
5. Styropian gr. 10 cm o wymiarach $100 \times 50 \times 10$ cm – szt. 172
6. Styrodur o wymiarach $120 \times 60 \times 5$ cm – szt. 24
7. Wełna mineralna grubość 20 cm w belach – 19 rolek
8. Korytka kanalizacyjne z PCV o długości 100 cm – szt. 61
9. Korytka kanalizacyjne z PCV – długości 50 cm – 3
10. Osadniki – szt. 6

- IV. Stwierdzono, że chodnik wykonany z kostki brukowej czerwonej o grubości 6 cm po tegorocznej zimie stał się niestabilny. Zachodzi konieczność jego przełożenia łącznie z ławą betonową w ilości -

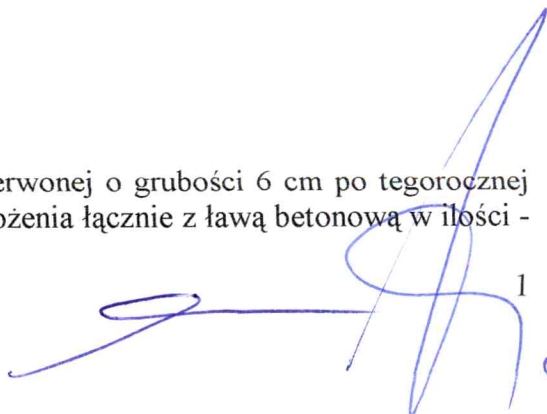

250,57 m². To samo dotyczy obrzeży o wymiarach 100x30x8 cm w ilości – 428,20 mb. Schody zewnętrzne z drogi dojazdowej do budynku szkoły też do przełożenia.

V. W magazynie obok budowy Kompleksu Orlik są złożone materiały do budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej:

1. Klej do nawierzchni 15x200 kg + 1x50kg= 3050 kg.
2. Natrysk 5x50 kg = 250 kg.
3. Granulat kolor czerwony 1 paleta – 40 worków
4. Granulat SBR –11 ton

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu jego treści podpisano.

Niegowa, dnia 18.04.2013 r.

- Z upoważnienia Wójta
Sekretarz Gminy*
1. *Mirosław Szczepańczyk*
 2. Projektant Budowlany
WYCONA I K. POMOCY
"G. U. B. U. D."
inż. Augustyn Ulman
42-810 ŻARKI
ul. Mostowa 5, tel. (034) 814-81-71
3. *Piotrek Plusz*

**Protokół
z dnia 08.05.2013 r.**

spisany w dniu 08 maja 2013 r. podczas pobrania próbek materiałów z magazynów do budowy boiska z poliuretanu przy zadaniu pn. **Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Gminie Niegowa przy Szkole Podstawowej w Ludwinowie nr 30**

Komisja w składzie:

Przedstawiciele Gminy Niegowa:

1. Mirosław Szczepańczyk – Przewodniczący Komisji
2. Paweł Piśkuła – Inspektor UG Niegowa

Przy obecności:

1. Elżbieta Muskała – Właściciel nieruchomości (magazyn położony w Ludwinowie Nr 31 A)

Stwierdza, co następuje:

- I. W magazynie obok budowy Kompleksu Orlik znajdują się materiały do budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej tj.:
1. Klej do nawierzchni:
 - a) CHEMOLAN M50 ozn. wew. M – 7 x 200 kg = 1400 kg
 - b) CHEMOLAN M50 ozn. wew. M50 – 8 x 200 kg = 1600 kg
 - CHEMOLAN M50 ozn. wew. M50 – 1 x 50 kg = 50 kg
 2. Natrysk 5x50 kg = 250 kg.
 - a) Chemal PW4 AB Natrysk Składnik A – 4 x 50 kg = 200 kg
 - b) Chemal PW4 AB Natrysk Składnik B – 1 x 50kg = 50 kg
 3. Granulat kol. czerwony 1 paleta – 40 worków – waga 1 worka około 25 kg
 4. Granulat SBR – 11 ton

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu jego treści podpisano.

Niegowa, dnia 08.05.2013 r.

Z upoważnienia Wójta
Sekretarz Gminy

1. Mirosław Szczepańczyk

2. Paweł Piśkuła
